EFDC - CHBP

ID	Task Name	Start	Finish
1	**Phase 1**	Wed 01/05/13	Tue 01/07/14
2	Feasibility	Mon 03/06/13	Fri 28/06/13
3	Cabinet Approval	Mon 08/07/13	Mon 08/07/13
4	Preparation of Planning applications	Tue 09/07/13	Mon 07/10/13
5	Planning	Tue 08/10/13	Wed 08/01/14
6	Procurement	Thu 09/01/14	Wed 28/05/14
7	On site	Thu 29/05/14	Fri 31/07/15
8	Practical Completion	Mon 03/08/15	Mon 03/08/15
9	**Phase 2**	Mon 04/11/13	Fri 19/02/16
10	Feasibility	Mon 04/11/13	Mon 13/01/14
11	Cabinet Approval	Tue 04/02/14	Tue 04/02/14
12	Preparation of Planning applications	Wed 05/02/14	Tue 20/05/14
13	Planning	Wed 21/05/14	Tue 23/09/14
14	Procurement	Wed 24/09/14	Tue 10/02/15
15	On site	Wed 11/02/15	Fri 19/02/16
16	Practical Completion	Fri 19/02/16	Fri 19/02/16
17	**Phase 3**	Mon 09/06/14	Wed 01/06/16
18	**Phase 4**	Mon 05/01/15	Fri 31/03/17
19	**Phase 5**	Wed 01/07/15	Fri 01/09/17
20	**Phase 6**	Mon 01/02/16	Fri 05/01/18

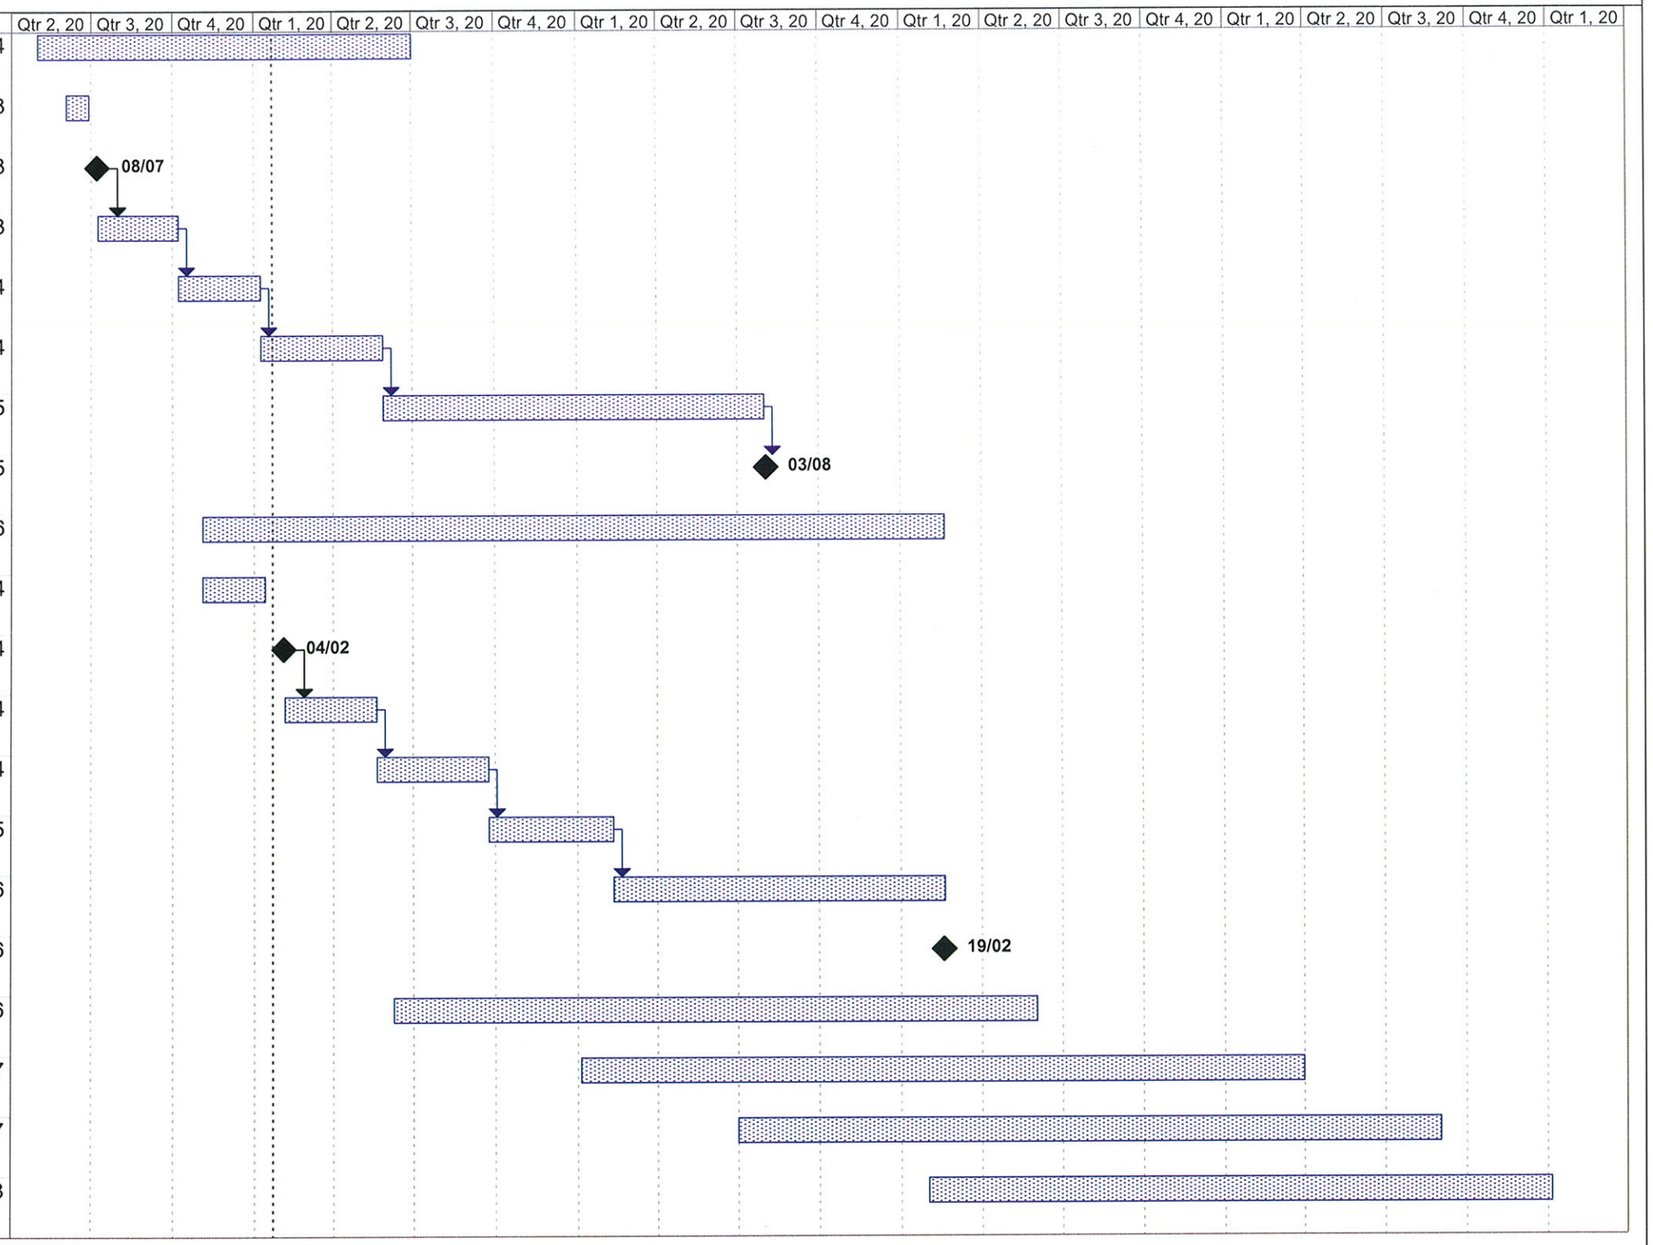

Project: EFDC - CHBP
Date: Tue 21/01/14

Task		Progress		Summary		External Tasks		Deadline	
Split		Milestone		Project Summary		External Milestone			
